

Anfrage per Fax: **0341 - 699 36 171** oder per Email: **balkone@braunhandel.de**

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_


Telefon: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Tragen Sie bitte folgende Informationen in die Skizze und Felder ein:

1. **Anzahl Balkone gesamt** \_\_\_\_\_ davon übereinander \_\_\_\_\_


2. **die gewünschten Außenmaße**

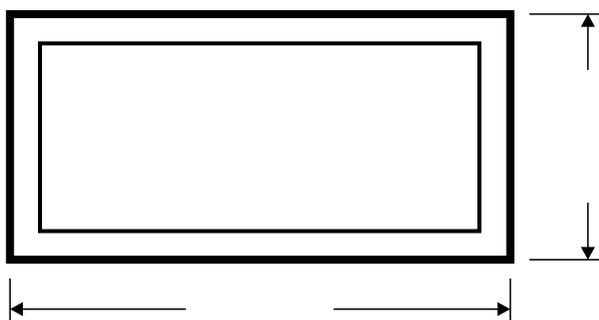


Alle Maßangaben BITTE in mm

3. **die Position am Haus** (zutreffendes bitte ankreuzen)


Positionsplan 2,50 bis 4,00 m




4 Stützen  
(Streifenfundamente)



2 Konsolen + 2 Stützen  
(Punktfundamente)




3 Konsolen + 1 Stütze  
(Punktfundament)




3 Konsolen + 1 Stütze  
(Punktfundament)


Positionsplan ab 5,00 m (Anzahl der Stützen ist abhängig von der Balkongröße)




6 Stützen  
(Streifenfundamente)



3 Konsolen + 3 Stützen  
(Punktfundamente)



4 Konsolen + 2 Stützen  
(Punktfundamente)



4 Konsolen + 2 Stützen  
(Punktfundamente)

## Ihre Angaben:

**A** Oberkante Fundament bis Oberkante Balkonaustritt  
(Fußboden Haus)

\_\_\_\_\_ mm

(bei mehreren Etagen tragen Sie bitte die Höhen in die Skizze ein)

**B** Austrittsstufe (zutreffendes bitte ankreuzen)

Eine Austrittsstufe verhindert das Eindringen von Regenwasser.  
Wenn Sie eine Austrittsstufe wünschen, muss diese lt. Vorschrift  
eine Höhe zwischen 12 und 15 cm betragen.

Nein       120 mm       150 mm

(zutreffendes bitte ankreuzen)

prüffähige Statik erwünscht       Ja       Nein

Montage erwünscht       Ja       Nein


Wärmedämmung vorhanden       Ja      \_\_\_\_\_ mm       Nein

Sonstige Informationen:

-----

-----

-----

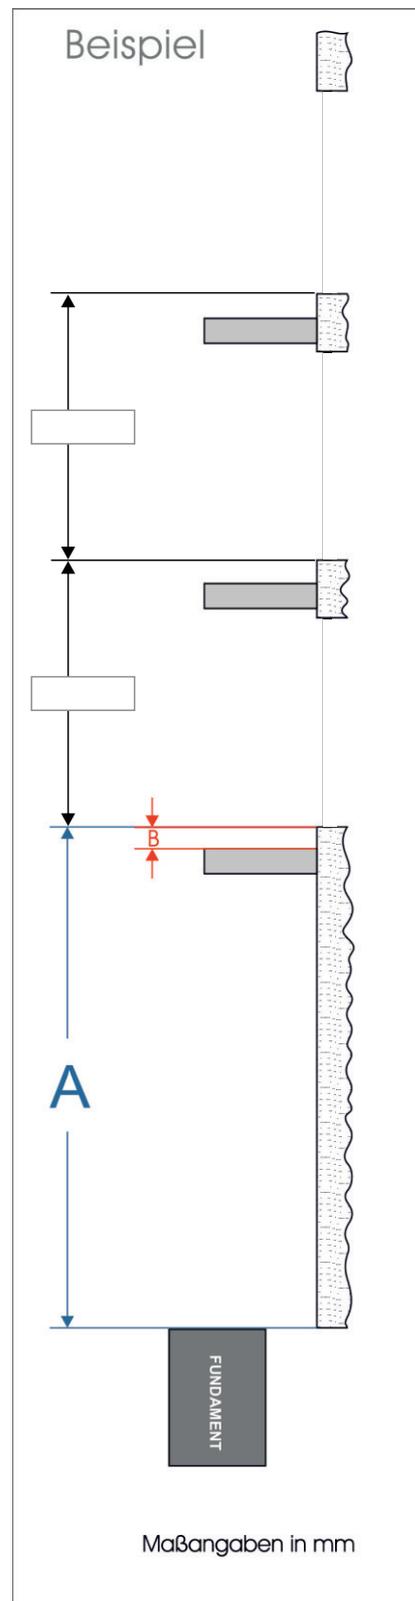

Maßangaben in mm

Nachdem Ihr Anfragebogen bei uns eingegangen ist, wird sich bei Bedarf ein Mitarbeiter mit Ihnen in Verbindung setzen.

Folgende Punkte sind zu klären:

## 1. Statik

Zu unserem Camaro-Balkone® Standardsystem bieten wir auf Wunsch eine prüffähige Statik im Wert von 357,00 Euro an.

Zu beachten ist, sollte ihr Balkon von unserem Standardangebot abweichen, muss eine komplett neue Statik berechnet werden. Diese kostet ca. 893,00 Euro.

## 2. Bodenbelag

Wir bieten Ihnen einen selbstentwässernden Holzboden aus Sibirischer Lärche (28 mm stark) mit eingeschobenen Edelstahlschienen oder auf Wunsch Aluminiumquintettblech (3,5 / 5 mm stark) an.

## 3. Entwässerung

Unsere Standardbalkone werden über ein Frontstützrohr entwässert.

Am unteren Ende des Stützrohres (oberhalb des Fundaments) befindet sich ein Stutzen, über den Sie das Regenwasser in Ihr vorhandenes System einleiten können.

Teilen Sie uns bitte mit, auf welcher Seite das Regenwasser eingeleitet werden soll (kürzeste Entfernung zu Ihrem Regenwassersystem).

## 4. Befestigungsvarianten des Balkons

**Freistehende Konstruktion (Stützen)** (Anzahl der Stützen ist abhängig von der Balkongröße)

Bei dieser Variante ist die komplette Balkonanlage freistehend und wird über Einklebeanker am Haus fixiert.

**Befestigung über Konsolen**

Diese Variante ist optisch schöner, da die wandseitigen Stützen entfallen (siehe Referenzfotos).

Die Montage ist allerdings komplizierter, da die Konsolen exakt in Waage und Lot eingemauert werden müssen.

Hierzu bieten wir Ihnen an, Sie im Bedarfsfall zu beraten.

Oder schauen Sie auch auf unsere Webseite: [www.camaro-balkone.de](http://www.camaro-balkone.de)

## 5. Geländer

Nach Bauvorschrift ist bei Balkonanlagen über 12 Meter Höhe eine Geländerhöhe von 1,10m Vorschrift.
